

DODATEK Č.4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 321/OD/2024) pro zakázku s názvem:

Ul. Masarykova, Trnovany – I. etapa (Jezevčík) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
[REDAKCE]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [REDAKCE]

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.
jednající/zastoupen: [REDAKCE]
zmocnění: [REDAKCE], dle plné moci ze dne 14.04.2025
sídlo: Kacírkova 982/4, PSC 150 00 Praha 5
IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.: 801200379/0800
e-mail: [REDAKCE]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDAKCE] dle plné moci
ze dne 14.04.2025
ve věcech technických: [REDAKCE]
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE] autorizovaný stavitel, stavbyvedoucí, [REDAKCE]
[REDAKCE]
zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – změnový list, popis změn a oceněný soupis prací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	20.930.201,04 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	21.302.115,06 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	21.507.151,87 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	3.036.234,37 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	1.396.841,94 Kč
Celková cena bez DPH	23.146.544,30 Kč
DPH 21 %	4.860.774,30 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	28.007.318,60 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 4 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0437/2025 ze dne 6.6.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 4 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: Změnový list č.4, popis změn a oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis



Datum:
2025.06.10
13:07:09 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy


V Berouně dne viz. elektronický podpis


Datum:
2025.06.10
08:25:25 +02'00'


Datum:
2025.06.10
08:23:49 +02'00'

za zhotovitele:

zmocnenci dle PM ze dne 14.04.2025

Dodatek prověřil:


Datum: 2025.06.10 08:17:04
+02'00'

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „UL. MASARYKOVA, TRNOVANY – I. ETAPA (JEZEVČÍK)	Číslo změny: 4
Registrační číslo: Č. Objednatele: 321/OD/2024	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zásyp kaverny včetně odstranění jámky - km 0,065 2. Amicom - práce spojené s přeložkou nadzemního vedení 3. Ruční rozebírání zámkové dlažby, odkop a rozhrnutí ŠD - prostory nevhodné pro mechanizaci - km 0,120 - 0,160 4. Výduch vzduchotechniky typ B - provedení v nerez + 1ks navíc 5. Přeložení stávající zámkové dlažby (napojení zámkové dlažby v průchodu) - km 0,240 6. Odkop zeminy místo bourání betonu v chodníku - km 0,110 – KÚ 7. Provedení odvodnění u rampy - km 0,145 8. Betonový schod u ochozu - km 0,300 9. Zámková dlažba včetně konstrukčních vrstev a AZ - km 0,420 0,435 10. Odkop výsadbových jamek pro výsadbu stromů 11. Výměna kanalizačního kónusu za zákrytovou desku (2ks) - km 0,096; 0,303 12. Záměna zámková dlažby tloušťky 6 cm za betonovou dlažbu tloušťky 4 cm - km 0,095 13. Výduch vzduchotechniky typ A - provedení komplet nové (4ks) 14. Provedení signálního pásu v chodníku - km 0,130 - 0,195 15. Výměna a výšková úprava kanalizačních poklopů - km 0,420 0,435 16. Doplnění zeminy do zeleného pásu po vybourání betonu 17. Pokládka rezervní chráničky pro VO - km 0,358 - KU 18. Nahrazení zeminy s VAPEXEM DK 2/5 - spárování vegetační dlažby 19. Odstranění ocelové trouby z prokořitelného prostoru - km 0,358 20. Napojení drenáže z prokořitelného prostoru do kanalizační šachty - km 0,376 21. Provedení kanalizačních poklopů na nalezených šachtách v zeleném pásu - km 0,197 - 0,386 22. Odkop zeminy místo bourání betonu v parkovacích stání - km 0,110 - KÚ 23. Odkop zeminy místo bourání betonu v komunikaci - km 0,110 - KÚ 24. Odkop zeminy místo bourání betonu v prokořitelném prostoru 25. Úprava nerezového poklopu kolektoru na otevírání z vnějšku 	
příloha:	
- Nabídkový rozpočet – soupis prací	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	1 639 392,43 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	+ 3 036 234,37 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 1 396 841,94 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní

Za zhotovitele: [REDACTED]			
Za objednatele: [REDACTED]			
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY			
Identifikace stavby: „UL. MASARYKOVA, TRNOVANY – I. ETAPA (JEZEVČÍK)		Číslo změny: 4	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 321/OD/2024			
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno: <input type="checkbox"/> poštou <input type="checkbox"/> poslem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p>Celkem přípočtů a odpočtů: + 3 036 234,37 Kč - 1 396 841,94 Kč ----- + 1 639 392,43 Kč</p>			
Počet připojených listů:2		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 21.507.151,87 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	+ 3 036 234,37 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 1 396 841,94 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	23.146.544,30 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: VARIA s.r.o. [REDACTED]		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: STRABAG a.s, [REDACTED]	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice Simona Zajícová			

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„UL. MASARYKOVA, TRNOVANY – I. ETAPA (JEZEVČÍK)
VČETNĚ VO“

Registrační číslo:

Č. Objednatele: 321/OD/2024

Podrobnější popis změny – méně práce, vícepráce:

1. Zásyp kaverny včetně odstranění ocelových jímek – km 0,065

- V místě zeleného pásu, mimo prokořenitelný prostor zastižena zděná jímka s ocelovou jímkou uvnitř, jednalo se o odpojené a nefunkční zařízení. Je nutné ocelovou jímku odstranit a zděnou jímku zasypat zeminou.



2. Výměna kanalizačního kónusu za zákrytovou desku (2ks) - km 0,096; 0,303

- V km 0,096 v komunikaci byla zjištěna poškozený kanalizační kónus, navrhujeme výměny za zákrytovou desku kvůli výškovým poměrům. To stejné platí i u kanalizačního poklopu v km 0,303 pouze ten se nachází na rozmezí parkovacího stání a chodníku




3. Amicom - práce spojené s přeložkou nadzemního vedení

- Při přeložce nadzemního vedení (fi. AMICOM), bylo nutné část vedení provést jako podzemní, proto je nutné uložit do země plastovou chráničku. Dále po startovací jámě je nutné znovu položit zámkovou dlažbu.



4. Ruční rozebírání zámkové dlažby, odkop a rozhrnutí ŠD – prostory nevhodné pro mechanizaci - km 0,120 - 0,160

- V místě pod ochozem lemované rampou se nenachází v konstrukčních vrstvách předpokládaný beton, ale zemina. Zeminu i stávající zámkovou dlažbu je nutné odstranit ručně z důvodu technického stavu ochozu a stísňených podmínek.

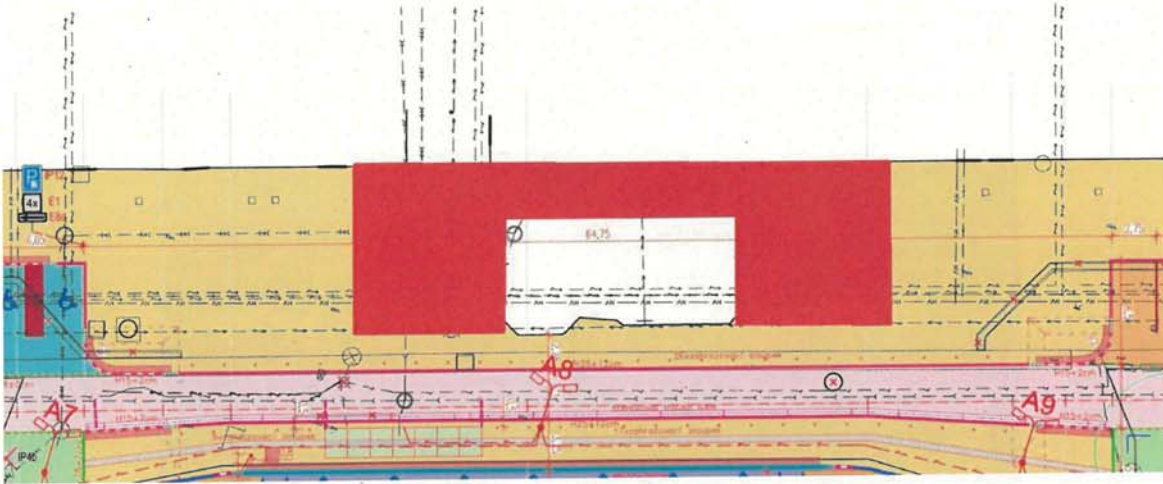

5. Výdech vzduchotechniky typ B – provedení v nerez + 1ks navíc

- PD předpokládá s provedením 4 stříšek. Reálně se jich na stavbě nachází 5. Dále navrhuje provedení stříšky komplet v nerez, dojde k prodloužení životnosti a sjednocení materiálů v rámci výdechů.


6. Přeložení stávající zámkové dlažby (napojení zámkové dlažby v průchodu) - km 0,240

- U posledního průchodu v budově Jezevčák po směru staničení je nutné přeložit stávající zámkovou dlažbu pro správné výškové napojení starého a nového povrchu zámkové dlažby.



7. Odkop zeminy místo bourání betonu v chodníku – km 0,110

- Při sejmutí zámková dlažby zjištěno, že se v konstrukčních vrstvách nestmelených ani v aktivní zóně nenachází beton, ale zemina.



8. Odvodnění u rampy – km 0,145

- V místě napojení rampy na rekonstruovaný chodník se nachází již nefunkční monolitický liniový žlab. Pro správnou funkčnost odvodnění chodníku je nutné provést nové liniové odvodnění.



9. Oprava betonového schodu u ochozu – km 0,300

- První schod u schodiště na ochoz budovy Jezevčák je v dezolátním stavu. Nutné provést nový schod.



10. Zámková dlažba včetně konstrukčních vrstev a AZ – km 0,420 – 0,435

- Navrhujeme rozšíření rekonstrukce chodníku z důvodu sjednocení dlažeb.



11. Odkop výsadbových jamek pro výsadbu stromů

- Po provedení prokořenitelného prostoru je nutné provést odkop pro výsadbu stromů.



12. Záměna zámkové dlažby tloušťky 6cm za betonovou dlažbu tloušťky 4 cm – km 0,095

- Pod schody na ochoz budovy Jezevčik byl zastižen v chodníku beton, tento beton je nutné začistit a z důvodu výškového uspořádání vyměnit v tomto místě betonovou dlažbu tloušťky 6 cm za betonovou dlažbu tloušťky 4cm.




13. Výduch vzduchotechniky typ A – provedení komplet nové (4ks)

- PD předpokládala pouze s výměnou stříšky a větrací mřížky na výduchu vzduchotechniky A. Stávající průduchy jsou poškozené a navrhujeme jejich kompletní nové provedení.



14. Provedení signálního pásu v chodníku – km 0,130 – 0,195

- Na základě požadavků projektanta je nutné provést signální pás u chodníku okolo zastávky. Provedení dle nového situačního výkresu

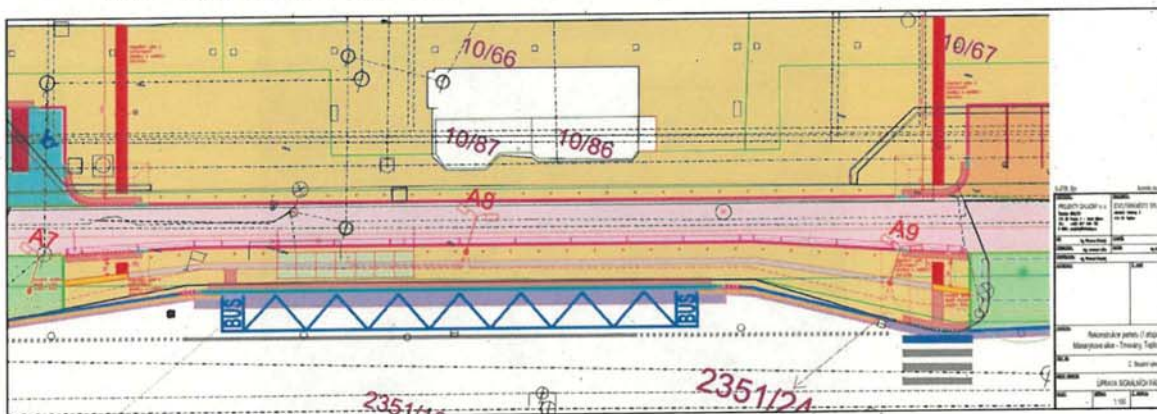

15. Výměna a výšková úprava kanalizačních poklopů – km 0420 – 0,435

- V rámci rozšíření rekonstrukce chodníku navrhujeme výměnu a výškovou úpravu kanalizačních šachet.



16. Doplnění zeminy do zeleného pásu po vybourání betonu

- Po odbourání betonu v zeleném pásu, vznikl prostor, který je před zahradnickými pracemi nutné zavozit vhodnou zeminou/ornicí.




17. Pokládka rezervní chráničky pro VO – km 0,358 - KÚ

- Na žádost zástupce fi. Marius Pedersen je nutné uložit rezervní chráničku pro VO.



18. Napojení drenáže z prokořenitelného prostoru do kanalizační šachty – km 0,376

- Dle PD je drenáž z posledního prokořenitelného prostoru napojení do uliční vpusti. Výškové uložení uliční vpusti není dostatečně hluboko, proto je nutné drenáž napojit do přilehlé kanalizační šachty.

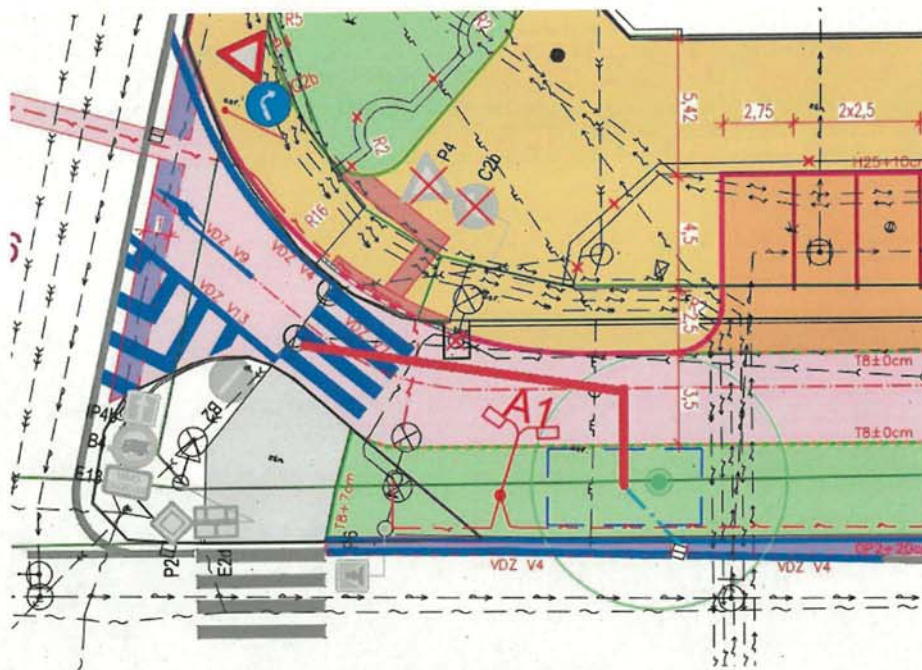


19. Provedení kanalizačních poklopů na nalezených šachtách v zeleném pásu – km 0,197 – 0,386

- V zeleném pásu po odbourání betonu nalezeny dvě šachty. Na tyto šachty je potřeba osadit kanalizační poklop.




20. Odkop zeminy místo bourání betonu v parkovacím stání – km 0,110 - KÚ
- Při provádění sanace AZ nebyl zastižen beton, jak předpokládala PD, ale zemina.




21. Odkop zeminy místo bourání betonu v komunikaci – km 0,110 - KÚ

- Při provádění sanace AZ nebyl zastižen beton, jak předpokládala PD, ale zemina.

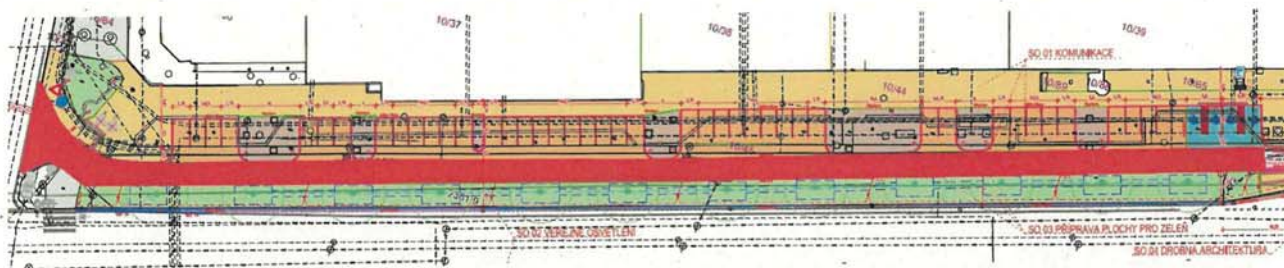

22. Odkop zeminy místo bourání betonu v prokořenitelném prostoru – km 0,110 - KÚ

- Při provádění sanace AZ nebyl zastižen beton, jak předpokládala PD, ale zemina.



23. Úprava nerezového kolektoru na otevírání z vnějšku

- Dle PD mají být všechny nerezové poklopy vedoucí do podzemního kolektoru uzamykatelné a uzavíratelné zevnitř. Správce kolektoru si žádá dva nerezové poklopy upravit na otevírání zvenku.



Odůvodnění změny:

Bez provedení této změny by nebylo možné stavbu dokončit v požadované kvalitě a dle platných ČSN a vyhlášek. Stavbu by nebylo možné bezpečně užívat.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě, že nebude tato změna provedena, nebudou provedené práce dle platné legislativy a nebude možné stavbu převzít.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: VARIA s.r.o. TDS [Redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: STRABAG a.s., [Redacted]
Podpis objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice Simona Zajícová	

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		zásyp kaverny včetně odstranění jám				
1..1.	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuštěním	m3	54,000	422,22	22 799,88
	Poznámka	kaverna: 10*3*1,8= 54m3				
1..2.	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	92,700	273,00	25 307,10
	Poznámka	54*1,8 = 97,2t				
1..3.	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,800	5 160,00	4 128,00
	Poznámka	800Kg				
1..4.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,800	125,00	100,00
	Poznámka	800Kg				
1..5.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,800	128,00	102,40
	Poznámka	800Kg				
1.	Celkem	zásyp kaverny včetně odstranění jám				52 437,38
3.		AMICOM - práce spojené s přeložkou nadzemního vedení				
3..1.	460161154	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 5	m	36,000	650,00	23 400,00
	Poznámka	1. trasa - 4,5m; 2. trasa - 12mb; trasa 3. - 19,5mb = 36mb				
3..2.	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	36,000	30,48	1 097,28
	Poznámka	1. trasa - 4,5m; 2. trasa - 12mb; trasa 3. - 19,5mb = 36mb				
3..3.	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	36,000	46,50	1 674,00
	Poznámka	1. trasa - 4,5m; 2. trasa - 12mb; trasa 3. - 19,5mb = 36mb				
3..4.	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	36,000	7,31	263,16
	Poznámka	1. trasa - 4,5m; 2. trasa - 12mb; trasa 3. - 19,5mb = 36mb				
3..5.	460431164	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 5	m	36,000	86,80	3 124,80
	Poznámka	1. trasa - 4,5m; 2. trasa - 12mb; trasa 3. - 19,5mb = 36mb				
3..6.	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	5,000	411,17	2 055,85
	Poznámka	5*1= 5m2; zámková dlažba po startovací jámě				
3.	Celkem	AMICOM - práce spojené s přeložkou nadzemního vedení				31 615,09
4.		ruční rozebírání zámkové dlažby, odkop a rozhrnutí ŠD - prostory nevhodné pro mechanizaci - km 0,120 - 0,160				
4..1.	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	-225,500	24,38	-5 497,69
	Poznámka	dlažba: plocha se snížením přístupem - 225,5m2				
4..3.	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-225,500	81,06	-18 279,03
	Poznámka	beton: plocha se snížením přístupem - 225,5m2				
4..5.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-84,563	11,71	-990,23
	Poznámka	beton: 225,5*0,15*2,5 = 84,563t				
4..7.	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-253,688	11,71	-2 970,69
	Poznámka	beton: 84,563*3 = 253,688t				
4..9.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-84,562	60,95	-5 154,05
	Poznámka	beton: 225,5*0,15*2,5 = 84,563t				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4..11.	113154364	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	-676,500	50,86	-34 406,79
	Poznámka	beton AZ: 225,5*3 = 676,5m ²				
4..13.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-169,125	11,71	-1 980,45
	Poznámka	beton AZ: 225,5*0,3*2,5 = 169,125t				
4..15.	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-507,375	11,71	-5 941,36
	Poznámka	beton AZ: 169,125*3 = 507,375t				
4..17.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-169,125	60,95	-10 308,17
	Poznámka	beton AZ: 225,5*0,3*2,5 = 169,125t				
4..19.	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m ³	101,475	1 320,00	133 947,00
	Poznámka	zemina: 225,5*0,45= 101,475m ³				
4..21.	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m ³	101,475	176,60	17 919,98
	Poznámka	zemina: 225,5*0,45= 101,475m ³				
4..23.	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m ³	101,475	706,38	71 679,91
	Poznámka	zemina: 225,5*0,45= 101,475m ³				
4..25.	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m ³	m ³	101,475	213,00	21 614,18
	Poznámka	zemina: 225,5*0,45= 101,475m ³				
4..27.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	101,475	213,33	21 647,66
	Poznámka	zemina: 225,5*0,45= 101,475m ³				
4..29.	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	182,655	170,66	31 171,90
	Poznámka	zemina: 101,475*1,8 = 182,655t				
4..31.	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m ²	225,500	146,00	32 923,00
	Poznámka	dlažba: plocha se snížením přístupem - 225,5m ²				
4..33.	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m ³	22,500	176,60	3 973,50
	Poznámka	dlažba: 225,5*0,1= 22,5m ³				
4..35.	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m ³	22,500	706,38	15 893,55
	Poznámka	dlažba: 225,5*0,1= 22,5m ³				
4..37.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	m ³	56,375	128,00	7 216,00
	Poznámka	dlažba: 225,5*0,1*2,5= 56,375t				
4..39.	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	213,098	357,00	76 075,99
	Poznámka	ŠD: 101,475*2,1 = 213,098t				
4.	Celkem	ruční rozebírání zámkové dlažby, odkop a rozhrnutí ŠD - prostory nevhodné pro mechanizaci - km 0,120 - 0,160				348 534,21
5.		Výduch vzduchotechniky B				
5..1.	751311035R	Výduch vzduchotechniky typ B	kus	-4,000	44 943,53	-179 774,12
5..2.	nová	Výduch vzduchotechniky typ B- nerez	kus	5,000	75 988,53	379 942,65
	Poznámka	kompletní provedení v nerez				
5.	Celkem	Výduch vzduchotechniky B				200 168,53
6.		Přeložení stávající zámkové dlažby (napojení zámkové dlažby v průchodu - km 0,240)				
6..1.	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m ²	16,500	166,00	2 739,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčák)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Poznámka	5,5*3=16,5m2				
6..2.	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	16,500	134,00	2 211,00
6..3.	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	0,660	1 430,00	943,80
	Poznámka	16,5m2*0,04m=0,66m3				
6..4.	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	16,500	169,00	2 788,50
	Poznámka	5,5*3=16,5m2				
6..5.	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	16,500	470,34	7 760,61
	Poznámka	5,5*3=16,5m2 z výskytu				
6.	Celkem	Přeložení stávající zámkové dlažby (napojení zámkové dlažby v průchodu - km 0,240)				16 442,91
7.		Odkop zeminy místo bourání betonu v chodníku - km 0,110 - KÚ				
7..1.	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-1 532,525	81,06	-124 226,48
7..2.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-574,697	11,71	-6 729,70
	Poznámka	1532,525*0,15*2,5=574,697t				
7..3.	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-1 724,091	11,71	-20 189,11
	Poznámka	574,697*3=1 724,091 t				
7..4.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-574,697	60,95	-35 027,78
	Poznámka	1532,525*0,15*2,5=574,697 t				
7..5.	113155364	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	-4 597,575	32,62	-149 972,90
	Poznámka					
7..6.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1 149,394	5,86	-6 735,45
	Poznámka	4597,575*0,1*2,5=1149,394 t				
7..7.	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-3 448,182	5,86	-20 206,35
	Poznámka	1149,394*3=3448,182 t				
7..8.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-1 149,394	30,48	-35 033,53
	Poznámka	4597,575*0,1*2,5=1149,394 t				
7..9.	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	689,636	244,00	168 271,18
	Poznámka	1532,525*0,45=689,636 m3				
7..10.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	689,636	213,33	147 120,05
	Poznámka	1532,525*0,45=689,636 m3				
7..11.	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 379,272	170,66	235 386,56
	Poznámka	689,636*2=1 379,272 t				
7.	Celkem	Odkop zeminy místo bourání betonu v chodníku - km 0,110 - KÚ				152 656,49
8.		Odvodnění u rampy - km 0,145				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
8..1.	ACO.405121	ACO Drain N100 - 0,0, žlab 1,0m; předtvar. odtok DN110	ks	3,000	1 019,13	3 057,39
8..1.1	ACO.6314	ACO Drain N100 - C250, můstkový rošt 0,5m, litina	ks	5,000	588,51	2 942,55
8..1.2	ACO.447778	ACO Drain N100 - kombi stěna pro začátek/konec 1-10	ks	2,000	260,91	521,82
8..1.3	ACO.86	ACO Drain N100 - C250, aretace pro můstk. rošt 06314	ks	5,000	65,36	326,80
8..3.	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,000	1 040,00	3 120,00
8..4.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,660	4 170,00	2 752,20
	Poznámka	5,5*0,4*0,3=0,66m3				
8.	Celkem	Odvodnění u rampy - km 0,145				12 720,76
9.		Betonový schod u ochozu - km 0,300				
9..1.	129911121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,450	6 560,00	2 952,00
	Poznámka	3*0,3*0,5=0,45m3				
9..2.	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	1,125	516,00	580,50
	Poznámka	0,45*2,5 = 1,125t				
9..3.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,960	11,71	11,24
	Poznámka	0,45m3*2,1333=0,96 t				
9..4.	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,880	11,71	33,72
	Poznámka	0,45m3*2,1333=0,96 t * 3 km				
9..5.	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,960	60,95	58,51
9..6.	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	1,800	624,00	1 123,20
9..7.	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	1,800	156,00	280,80
9..8.	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,450	5 750,00	2 587,50
9.	Celkem	Betonový schod u ochozu - km 0,300				7 627,47
10.		Zámková dlažba včetně konstrukčních vrstev a AZ - km 0,420 0,435				
10..1.	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	13,500	207,52	2 801,52
	Poznámka	15*2*0,45=13,5 m3				
10..2.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	13,500	213,33	2 879,96
	Poznámka	5*2*0,45=13,5 m3				
10..3.	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,000	170,66	4 607,82
	Poznámka	13,5*2=27 t				
10..4.	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	30,000	24,38	731,40
	Poznámka	15*2=30 m2				
10..5.	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,500	11,71	87,83
	Poznámka	30*0,1*2,5=7,5 t				
10..6.	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	22,500	11,71	263,48
	Poznámka	7,5*3=22,5 t				
10..7.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,500	60,95	457,13

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Poznámka	30*0,1*2,5=7,5 t				
10..8.	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	30,000	25,36	760,80
	Poznámka	15*2=30 m2				
10..9.	596211255	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2	m2	30,000	470,34	14 110,20
	Poznámka	15*2=30 m2				
10..10.	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	30,000	331,07	9 932,10
	Poznámka	15*2=30 m2				
10..11.	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000	263,88	7 916,40
	Poznámka	15*2=30 m2				
10..12.	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	30,000	59,20	1 776,00
	Poznámka	15*2=30 m2				
10.	Celkem	Zámková dlažba včetně konstrukčních vrstev a AZ - km 0,420 0,435				46 324,64
11.		Odkop výsadbových jamek pro výsadbu stromů				
11..1.	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	13,090	207,52	2 716,44
	Poznámka	1*1*0,7*17 ks=13,09m3				
11..2.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	13,090	213,33	2 792,49
	Poznámka	1*1*0,7*17 ks=13,09m3				
11..3.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,562	170,66	4 021,09
	Poznámka	1*1*0,7*17 ks=13,09m3*1,8=23,562t				
11.	Celkem	Odkop výsadbových jamek pro výsadbu stromů				9 530,02
12.		Výměna kanalizačního kónusu za zákrytovou desku (2ks) - km 0,096; 0,303				
12..1.		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	4,800	1 428,32	6 855,94
	Poznámka	0,5*4*1,2= 2,4m3 *2 ks				
12..2.		Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	4,800	813,83	3 906,38
	Poznámka	0,5*4*1,2= 2,4m3* 2 ks				
12..3.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	4,800	213,33	1 023,98
	Poznámka	0,5*4*1,2= 2,4m3* 2ks				
12..4.	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,640	170,66	1 474,50
	Poznámka	2,4*1,8 = 4,32t *2 ks				
12..5.	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	10,080	519,00	5 231,52
	Poznámka	2,4*2,1= 5,04t *2 ks				
12..7.	893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 zákrytová deska	ks	2,000	2 150,00	4 300,00
12..8.	59224457	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojižděné D400	ks	2,000	7 850,00	15 700,00
12.	Celkem	Výměna kanalizačního kónusu za zákrytovou desku (2ks) - km 0,096; 0,303				38 492,32
13.		Záměna zámková dlažby tloušťky 6 cm za betonovou dlažbu tloušťky 4 cm - km 0,095				
13..1.	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-24,000	331,07	-7 945,68
13..2.	R - není kros	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 40mm přírodní	m2	24,000	458,85	11 012,40
13..3.	113155111	Frézování betonového krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	24,000	268,00	6 432,00
13..3.0	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	11,71	35,13

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)

STRABAG

Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
13..4.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,000	11,71	105,39
13..5.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,000	60,95	182,85
13.	Celkem	Záměna zámková dlažby tloušťky 6 cm za betonovou dlažbu tloušťky 4 cm - km 0,095				9 822,09
14.		Výdech vzduchotechniky typ A - provedení komplet nové (4ks)				
14..1.	129911101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně	m3	3,300	2 510,00	8 283,00
14..2.	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	8,250	516,00	4 257,00
14..3.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	8,250	127,00	1 047,75
14..4.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	m3	8,250	14,90	122,93
14..5.	313321774	Obkladová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže do ztraceného bednění z desek	m3	3,300	4 850,00	16 005,00
14..6.	59515403	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 150mm	kus	176,000	64,80	11 404,80
14..6.0	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,150	30 300,00	4 545,00
14..7.	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	22,000	712,00	15 664,00
14..8.	621142012	Potažení vnějších podhledů rabicovým pletivem	m2	22,000	174,00	3 828,00
14..10.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	32,000	242,00	7 744,00
14..11.	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	51,200	166,00	8 499,20
14..11.0	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	51,200	135,00	6 912,00
14..12.	623511122.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit hrubozrný vnějších pilířů nebo sloupů	m2	22,000	1 401,43	30 831,46
14.	Celkem	Výdech vzduchotechniky typ A - provedení komplet nové (4ks)				119 144,14
15.		Provedení signálního pásu v chodníku - km 0,130 - 0,195				
15..1.	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité	m2	25,000	146,28	3 657,00
15..1.0	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	3,750	516,00	1 935,00
15..3.	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	21,400	470,34	10 065,28
15..4.	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	21,400	595,93	12 752,90
15..5.	596211255	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2	m2	3,600	470,34	1 693,22
15.	Celkem	Provedení signálního pásu v chodníku - km 0,130 - 0,195				30 103,40
16.		Výměna a výšková úprava kanalizačních poklopů - km 0,420 0,435				
16..1.	899304811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotností přes 150 kg	ks	3,000	603,00	1 809,00
	Poznámka	kanalizační poklopy v chodníku: 3 kusů				
16..3.	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	ks	3,000	3 665,73	10 997,19
	Poznámka	kanalizační poklopy v chodníku: 3 kusů				
16..5.	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	ks	3,000	4 030,00	12 090,00
16.	Celkem	Výměna a výšková úprava kanalizačních poklopů - km 0,420 0,435				24 896,19
17.		Doplnění zeminy do zeleného pásu po vybourání betonu				
17..2.	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	729,500	17,30	12 620,35
17..3.	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	233,440	595,00	138 896,80
	Poznámka	729*0,2=145m3*1,6 koef				
17.	Celkem	Doplnění zeminy do zeleného pásu po vybourání betonu				151 517,15
18.		Pokládka rezervní chráničky pro VO - km 0,358 - KU				
18..1.	460161153	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	30,000	287,37	8 621,10

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)

STRABAG

Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
18..2.	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	30,000	30,48	914,40
18..3.	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	30,000	46,32	1 389,60
18..4.	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 110mm, HDPE+LDPE	m	30,000	61,70	1 851,00
18..5.	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	30,000	7,31	219,30
18..6.	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	30,000	51,20	1 536,00
18..7.	460431163	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	m	30,000	42,67	1 280,10
18.	Celkem	Pokládka rezervní chráničky pro VO - km 0,358 - KU				15 811,50
19.		Nahrazení zeminy s VAPEXEM DK 2/5 - spárování vegetační dlažby				
19..1.	10321100R	vodopropustná zemina s příměsí VAPEXU (v poměru 1 díl vapexu za 6 dílů zeminy)	m3	-18,102	3 654,58	-66 155,21
19..2.	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	38,014	780,00	29 650,92
	Poznámka	1293*0,014*2,1=38,0142 t				
19.	Celkem	Nahrazení zeminy s VAPEXEM DK 2/5 - spárování vegetační dlažby				-36 504,29
20.		Odstranění ocelové trouby z prokořenitelného prostoru - km 0,358				
20..1.	733120839	Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219	m	6,000	196,00	1 176,00
20..2.	460091113	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	0,900	1 580,00	1 422,00
20.	Celkem	Odstranění ocelové trouby z prokořenitelného prostoru - km 0,358				2 598,00
21.		Napojení drenáže z prokořenitelného prostoru do kanalizační šachty - km 0,376				
21..1.	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	23,520	1 180,00	27 753,60
21..2.	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	21,000	102,00	2 142,00
21..3.	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	2,350	498,00	1 170,30
	Poznámka					
21..3.0	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	4,200	445,00	1 869,00
21..4.	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,100	3 750,00	375,00
21..5.	460461711	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 v omezeném prostoru	m	21,000	214,00	4 494,00
21.	Celkem	Napojení drenáže z prokořenitelného prostoru do kanalizační šachty - km 0,376				37 803,90
22.		Provedení kanalizačních poklopů na nalezených šachtách v zeleném pásu - km 0,197 - 0,386				
22..1.	899304811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	ks	2,000	603,00	1 206,00
22..2.	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	ks	2,000	3 749,43	7 498,86
22..3.	63126038R	poklop šachtový s litinovým rámem kruhový DN 600 D400	ks	2,000	4 560,00	9 120,00
22.	Celkem	Provedení kanalizačních poklopů na nalezených šachtách v zeleném pásu - km 0,197 - 0,386				17 824,86
23.		Odkop zeminy místo bourání betonu v parkovacích stání - km 0,110 - KÚ				
23..1.	113155364	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	-4 540,000	32,62	-148 094,80
23..2.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1 135,000	5,86	-6 651,10
23..3.	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-3 405,000	5,86	-19 953,30
23..4.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-1 135,000	30,48	-34 594,80
23..5.	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	454,000	244,00	110 776,00
23..6.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	454,000	213,33	96 851,82
23..7.	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	908,000	170,66	154 959,28
23.	Celkem	Odkop zeminy místo bourání betonu v parkovacích stání - km 0,110 - KÚ				153 293,10

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)

STRABAG

Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
24.		Odkop zeminy místo bourání betonu v komunikaci - km 0,110 - KÚ				
24..1.	113155364	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	-3 570,000	32,62	-116 453,40
24..2.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-892,200	5,86	-5 228,29
24..3.	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-2 677,500	5,86	-15 690,15
24..4.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-892,500	30,48	-27 203,40
24..5.	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m ³ strojně	m ³	357,000	244,00	87 108,00
24..6.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	357,000	213,33	76 158,81
24..7.	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	714,000	170,66	121 851,24
24.	Celkem	Odkop zeminy místo bourání betonu v komunikaci - km 0,110 - KÚ				120 542,81
25.		Odkop zeminy místo bourání betonu v prokošenitelném prostoru				
25..1.	113107233	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	-1 302,000	146,49	-190 729,98
25..2.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-976,500	11,71	-11 434,82
25..3.	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-2 029,500	11,71	-23 765,45
25..4.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-976,500	60,95	-59 517,68
25..5.	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m ³ strojně	m ³	434,000	244,00	105 896,00
25..6.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	357,000	213,33	76 158,81
25..7.	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	868,000	170,66	148 132,88
25.	Celkem	Odkop zeminy místo bourání betonu v prokošenitelném prostoru				44 739,76
26.		Úprava nerezového poklopu kolektoru na otevírání z vnějšku				
26..1.	R	Demontáž otevírání zevnitř, montáž otevírání z vnějšku poklopu	ks	2,000	15 625,00	31 250,00
26.	Celkem	Úprava nerezového poklopu kolektoru na otevírání z vnějšku				31 250,00
Projekt: 856-CAMZ	Celkem	Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)				1 639 392,43

Za TSI VÍTRIA

Za ZHOTOVITELE
